

第5章 公共施設等のマネジメントの推進



未来戦略推進プラン 2023 第5章は、豊島区基本計画 2022-2025 第2編第3章「6. 公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントの推進」に記載する取組内容の具体化を図り、進捗管理を行うものです。未来戦略推進プランにおいては、(1) 新たに整備する施設、改築を行う施設、大規模な改修を行う施設 (2) 暫定的に活用している施設 (3) 未利用の区有地、などを掲載しています。

区施設等を安全・安心に利用できるよう、施設等の状況を踏まえたうえで、予防保全の考え方を基本とし、計画的な改築・改修を実施していきます。また、改修に際しては、国等の方針を踏まえ、施設等が長期間の利用に耐えうるよう、長寿命化改修についても検討します。

- ※1 所管課は原則として施設・財産を管理する課を掲載し、それ以外は施設等の再構築に係る関係課を掲載しています。
- ※2 大規模改修については、令和5年度予算にかかる案件を中心に掲載しています。
- ※3 維持補修が主となる小規模な改修などは掲載していません。
- ※4 仮移転等で再構築とは関係のない一時的な施設の転用については、掲載していません。
- ※5 各施設は原則、町名順に掲載しています。
- ※6 基準日は原則、令和5年4月1日です。

1 公共施設等の適正管理

(1) 新規整備・改築・大規模改修施設

① 区民ひろば

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
1	区民ひろば南大塚複合施設 (区民ひろば南大塚、南大塚地域文化創造館、南大塚保育園等)	地域区民ひろば課 学習・スポーツ課 保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う(昇降機設置を含む)。(令和6年12月完了予定) 改修中、南大塚地域文化創造館は休館予定、南大塚保育園は運営、区民ひろば南大塚は都営南大塚二丁目アパート内の統計調査事務室に仮移転する。 統計調査事務室は、旧文成小学校へ移転する。	設計	改修 (仮施設)	改修 (仮施設) リニューアル オープン	
2	区民ひろば清和複合施設 (区民ひろば清和、巣鴨地区保育所仮園舎等)	地域区民ひろば課 保育課	【現状】 埋蔵文化財調査中 【今後の予定等】 旧保健福祉部分庁舎跡地に区民ひろば清和と周辺保育園改築時の仮園舎を整備する。(令和7年度開設予定) 整備後は、区民ひろば清和(第一と第二が統合)と巣鴨第一保育園(改築中の仮園舎)が使用する。	設計	設計	整備	整備 オープン

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画			
					令和5年度	令和6年度	令和7年度	
3	区民ひろば 朋有複合施設 (区民ひろば朋有、東池袋フレイル対策センター、ジャンプ東池袋等)	地域区民ひろば課 高齢者福祉課 子ども若者課	【現状】 近隣の民間ビルを仮施設にして、規模を縮小して運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う(屋内階段、昇降機設置を含む)。(令和6年2月完了予定)	設計 改修(仮施設)	改修(仮施設) リニューアルオープン	/		
4	区民ひろば朝日	地域区民ひろば課	【現状】 朝日小学校横で運営中 【今後の予定等】 旧朝日中学校別棟を解体し、延床面積約1,000㎡の区民ひろばを整備する。(令和6年4月開設予定) 現区民ひろば朝日の活用については、地元町会等と調整を行う。	測量・設計 解体	整備			オープン(移転)
5	区民ひろば高南第二複合施設 (区民ひろば高南第二・高田介護予防センター)	地域区民ひろば課 高齢者福祉課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う(昇降機設置の検討を含む)。(令和7年度完了予定) 改修中、区民ひろば高南第二は、区民ひろば高南第一へ移転する。介護予防センターの仮施設は、検討を進める。	昇降機設置の検討	設計	設計 改修(仮施設)	改修(仮施設) リニューアルオープン	
6	区民ひろば長崎複合施設 (区民ひろば長崎、長崎休日診療所等)	地域区民ひろば課 高齢者福祉課 地域保健課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 区民ひろば長崎の拡張を含めた大規模改修を実施する。(令和7年3月完了予定) 改修中における区民ひろばの仮施設を検討する。(休日診療所は、改修中も運営)	設計	設計 改修(仮施設)	改修(仮施設) リニューアルオープン	/	

② 福祉・保健関係施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
7	西巣鴨地区特別養護老人ホーム (西巣鴨体育場)	福祉総務課	【現状】 西巣鴨体育場として運営中 【今後の予定等】 西巣鴨体育場に多目的広場や施設交流スペースを含めた特別養護老人ホーム等を整備する。	特養ホーム等の整備ニーズ検討	検討を踏まえた事業化		
8	福祉ホームさくらんぼ	障害福祉課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修を実施する。改修中は、旧朝日中学校校舎を仮施設として活用する。	仮移転先を検討	設計	改修(仮施設)	【令和8年度完了予定】
9	池袋保健所	地域保健課 都市計画課(再開発担当)	【現状】 造幣局跡地の仮施設で運営中 【今後の予定等】 令和7年度末に竣工予定の南池袋二丁目C地区の再開発ビルへ移転する。(令和8年度開設予定)	仮施設にて運営			

③ 学校施設

(i) 改築

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
10	千川中学校 複合施設 (千川中学校、 西部子ども家庭 支援センター、 教育センター、 地域交流スペース)	学校 施設課 子ども 家庭支援 センター 教育 センター	【現状】 運営中 【今後の予定等】 「豊島区立小・中学校改築計画」 及び「豊島区学校施設等長寿命化 計画」に基づき、改築工事を行 う。西部子ども家庭支援センター と教育センターの一部機能を複 合化するとともに、郷土資料の展示 機能の整備や学校図書館の地域開 放なども検討する。	設計	設計	解体・整備 (仮校舎)	整備 (仮校舎) 【令和8年度 開校予定】
11	西部区民事務所 等複合施設 (愛称：学び舎 びいす) (小中学校仮校 舎、西部区民事 務所、西部高齢 者総合相談セン ター、西部障害 支援センター)	学校 施設課 企画課 (施設計 画担当) 西部区民 事務所 高齢者 福祉課 障害 福祉課	【現状】 西部区民事務所、西部高齢者総合 相談センター、西部障害支援セン ターとして活用中 【今後の予定等】 西部区民事務所、西部高齢者総合 相談センター、西部障害支援セン ター、小中学校仮校舎等の機能を 複合化した施設を整備する。 (学校エリアは令和6年4月開設 予定) 西部区民事務所、西部高齢者総合 相談センター、西部障害支援セン ターは、令和5年10月に新施設に 移転予定。	設計 整備	整備 西部区民 事務所等 オープン	千川中学校 (仮校舎) 西部区民事務所等 運営	
12	朋有小学校 別棟	学校 施設課	【今後の予定等】 今後の児童数増加に対応するた め、別棟建設による教室確保を図 る。	検討	方針 検討	検討を踏まえた 事業化	
13	南池袋小学校 別棟	学校 施設課 放課後 対策課	【今後の予定等】 今後の児童数増加に対応するた め、体育館棟を改築し、体育館、 子どもスキップ、特別教室等を整 備し、校舎内の教室確保を図る。 (令和7年度開設予定)	検討	設計 解体・整備	整備	整備 オープン
14	高南小学校 別棟	学校 施設課 保育課 放課後 対策課	【今後の予定等】 敷地内に別棟を建設する。 (令和5年10月開設予定) 整備後は、学校及び高南保育園改 築時の仮園舎として活用する。 仮園舎使用後は、学校及び子ども スキップとして活用する。	設計 整備	整備 オープン 学校及び 高南保育園 仮園舎	学校及び 高南保育園 仮園舎	学校及び 子ども スキップ

(ii) 大規模改修

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
15	仰高小学校	学校施設課	【今後の予定等】 給食室の改修を行う。		設計	改修	
16	駒込小学校	学校施設課	【今後の予定等】 給食室等の改修を行う。		設計	改修	
17	西巣鴨小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調等の改修を行う。	改修 (外壁、 教室)	設計 (空調)	改修 (空調)	
18	朋有小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調等の改修を行う。	改修 (プール、 トイレ、 給食室)	設計 (空調)	改修 (空調)	
19	南池袋小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調、給食室、教室等の改修を行う。	設計 (空調、 給食室)	改修 (給食室)	改修 (空調)	改修 (教室)
20	池袋小学校	学校施設課	【今後の予定等】 校庭等の改修を行う。	設計	改修		
21	高南小学校	学校施設課	【今後の予定等】 校庭等の改修を行う。	設計 (校庭) 改修 (教室等)	改修 (校庭) 設計・改修 (教室)		
22	椎名町小学校	学校施設課	【今後の予定等】 プール、教室等の改修を行う。	設計 (プール、 教室) 改修 (校庭)	改修 (プール、 教室) 設計 (教室)	改修 (教室)	
23	長崎小学校	学校施設課	【今後の予定等】 屋上・教室等の改修を行う。	設計	改修		
24	西巣鴨中学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調等の改修を行う。	設計	改修		
25	明豊中学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調設備の更新を行う。	改修方針 検討	改修		

④ 保育園等

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
26	池袋第一 保育園	保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 厨房の改修を行う。	設計	改修	/	
27	巣鴨第一保育園	保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 現敷地で改築を行う。 改築中は、旧保健福祉部分庁舎跡地に整備する仮園舎を活用する。	方針検討	運営	設計	設計 解体・整備 (仮園舎)
28	駒込第二 若草保育園	保育政策 担当	【現状】 運営中 【今後の予定等】 現敷地で改築を行う。 改築中は、旧保健福祉部分庁舎跡地に整備する仮園舎を活用する。	方針検討	運営		
29	めぐみ保育園	保育政策 担当	【現状】 運営中 【今後の予定等】 外壁・屋上・ブロック塀の改修を行う。	設計	改修	/	
30	高南保育園	保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 改築を行う。(令和7年3月開設予定) 改築中は、高南小学校内の別棟を仮園舎として活用する。	測量・設計	設計 解体・整備 (仮園舎)	整備 (仮園舎) オープン	/
31	目白第一 保育園	保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 空調設備等の更新を行う。	設計	改修	/	
32	南長崎第一 保育園	保育課	【現状】 千早地区保育所仮園舎にて運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う。(令和6年3月完了予定) 改修中は、千早地区保育所仮園舎を活用する。	修正設計 改修 (仮園舎)	改修 (仮園舎) リニューアル オープン	/	
33	長崎保育園	保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う。(令和7年3月完了予定) 改修中は、千早地区保育所仮園舎を活用する。	設計	設計 改修 (仮園舎)	改修 (仮園舎) リニューアル オープン	/

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
34	池袋幼稚園 池袋第五保育園 (保育所型認定 こども園)	庶務課 (教育施 策推進担 当) 保育課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 池袋幼稚園と池袋第五保育園を統 合し、分園による保育所型認定こ ども園を設置する。(令和7年度 開設予定)	方針検討	設計 改修	改修	リニューアル オープン (認定 こども園)
35	区立幼稚園	庶務課 (教育施 策推進担 当)	【今後の予定等】 園児数が減少している状況を踏ま え、区立幼稚園のあり方について 検討する。	検討	方針検討		
36	西部子ども家庭 支援センター	子ども 家庭支援 センター	【現状】 運営中 【今後の予定等】 千川中学校の改築に合わせて千川 中敷地へ移転し、学校及び教育セ ンターとの複合化を図る。(令和 8年度)	方針検討	運営		

⑤ 文化施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
37	上池袋図書館	図書館課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う。 改修中は休館予定。	改修 方針検討	設計		改修 【令和8年度 開設予定】
38	池袋図書館	図書館課 企画課 (施設計 画担当)	【現状】 運営中 【今後の予定等】 周辺を含めたエリア全体としての 防災性と地域の魅力を高める方策 を検討する中で、改築プランを検 討する。	整備方針検討			
39	千早図書館	図書館課 企画課 (施設計 画担当)	【現状】 運営中 【今後の予定等】 現地で改築を行う。 改築中は休館予定。 (休館中は、西部区民事務所等複 合施設内で図書貸出を実施予定)	方針検討	調査	設計 【令和10年度開設予定】	
40	千早地域文化 創造館	学習・ スポーツ課 企画課 (施設計 画担当)	【現状】 運営中 【今後の予定等】 現地で改築を行う。 改築中は休館予定。	解体 (多目的 ホール) 方針検討	設計	設計 解体	整備 【令和8年度 開設予定】

⑥ スポーツ施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
41	総合体育場	学習・スポーツ課 企画課 (施設計画担当)	【現状】 運営中 【今後の予定等】 アーチェリー場を加えた管理棟の改築及び防球フェンスの設置工事について、令和5年度中に方針を決定し、事業化を図る。	方針検討	方針検討	検討を踏まえた事業化	
42	旧第十中学校 野外スポーツ施設	学習・スポーツ課	【現状】 旧校舎解体工事中 【今後の予定等】 サッカー、少年野球、テニス、ラグビーなど多目的な競技に対応した野外スポーツ施設を整備する。 (令和6年10月開設予定)	旧校舎解体	整備	整備 オープン	
43	千登世橋教育文化センター (雑司が谷体育館、雑司が谷地域文化創造館、教育センター等)	学習・スポーツ課 企画課 (施設計画担当) 文化デザイン課 教育センター	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修または改築を行うことにより、敷地の有効活用を図るために、再整備計画を検討する。 千川中学校の改築に合わせて、教育センターの一部機能を千川中敷地へ移転し、学校及び西部子ども家庭支援センターとの複合化を図る。(令和8年度) 令和5年度は、昇降機の取替工事を行う。	再整備方針 検討 設計 (昇降機)	検討結果を踏まえた再整備の検討		
					改修 (昇降機)		

⑦ 住宅

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
44	千早四丁目 アパート (1・2号棟)	住宅課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 大規模改修を行う(昇降機設置を含む)。 (1号棟は令和6年度完了予定)	設計	設計 改修 (1号棟)	改修 (1号棟) リニューアル オープン (1号棟)	改修 (2号棟) 【令和8年度 完了予定】
45	千川つつじ苑	住宅課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 昇降機の更新を行う。	設計	改修		
46	長崎つつじ苑 複合施設 (長崎つつじ苑、 長崎第二豊寿園)	住宅課 高齢者 福祉課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 長崎つつじ苑は、昇降機の更新を行う。 長崎第二豊寿園は、大規模改修を行う。改修中は、休園予定。 (令和7年度完了予定)	改修方針 検討	設計	改修 (つつじ苑・ 豊寿園)	改修 (豊寿園) リニューアル オープン (豊寿園)

⑧ 環境

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
47	豊島清掃事務所	豊島清掃事務所	【現状】 運営中 【今後の予定等】 空調設備の更新を行う。	改修方針 検討	改修	/	

⑨ 公園

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
48	駒込地区さくらプロジェクト	公園 緑地課 文化 観光課	【今後の予定等】 駒込地区の公園・児童遊園にソメイヨシノの植樹を行う。	方針検討	実態調査	検討を踏まえた事業化	
49	大塚台公園	公園 緑地課	【今後の予定等】 全面リニューアル工事を行う。	検討	設計	整備 【令和8年度完了予定】	
50	上池袋中央公園	公園 緑地課	【今後の予定等】 用地の拡張とともに、キッズエリア整備を行う。 (令和5年度完了予定)	用地購入	整備 リニューアル オープン	/	
51	中池袋公園	公園 緑地課	【今後の予定等】 公園トイレの整備を行う。 (令和5年度開設予定)	設計 整備	オープン	/	
52	池袋本町三丁目第二児童遊園	公園 緑地課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 令和5年1月末に児童遊園敷地(都有地)の一部返還を行う。	都有地 返還	運営		
53	(仮称)雑司が谷三丁目広場(雑司が谷三丁目寄付物件)	土木 管理課 公園 緑地課	【今後の予定等】 雑司が谷三丁目寄付物件の跡地活用として、自転車駐車場と広場整備を行う。 (令和6年4月開設予定)	整備方針 検討	設計 整備	オープン	/
54	(仮称)高松一丁目公園(千川中学校プール敷地)	公園 緑地課 学校 施設課	【今後の予定等】 千川中学校の改築にあわせて、千川中学校プール敷地(飛び地)での公園整備を行う。	整備方針 検討 設計	設計	解体	整備 【令和8年度 開設予定】

⑩ 自転車駐車場等

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
55	大塚駅北口路上 自転車駐車場	土木 管理課	【今後の予定等】 大塚駅北口の路上に自転車駐車場 を整備する。 (令和6年度開設予定)	整備 (1期目)	設計 (2期目)	整備 (2期目) オープン	

⑪ その他

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
56	各救援センター	防災危機 管理課	【今後の予定等】 敷地内にマンホールトイレ未設置 の8施設について、2カ年で設置を 行う。	方針検討	豊島体育館 巢鴨小 西巢鴨中 旧真和中 旧文成小	みらい館大明 豊成小 長崎小	

(2) 暫定活用施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
57	千早地区保育所 仮園舎	保育課	【現状】 暫定活用中 【今後の予定等】 南長崎第一保育園及び長崎保育園 における改修中の仮園舎として活 用する。	暫定活用	仮園舎活用 (南長崎第一 保育園)	仮園舎活用 (長崎保育園)	活用検討
58	巢鴨埋蔵 文化財収蔵庫	庶務課	【現状】 埋蔵文化財の一時保管場所として 暫定活用中 【今後の予定等】 敷地の有効活用などを検討中。		暫定活用 有効活用等検討		
59	旧雑司が谷 保育園	総務課	【現状】 文書倉庫として暫定活用中 【今後の予定等】 敷地の有効活用などを検討する。		暫定活用 有効活用等検討		
60	旧高松第一 保育園	財産 運用課	【現状】 倉庫として暫定活用中 【今後の予定等】 有効活用などを検討する。		暫定活用 有効活用等検討		
61	旧竹岡健康学園	財産 運用課	【現状】 民間事業者に貸付中 売却事業者が決定し、契約手続中。 【今後の予定等】 売却後もスタジオは当面継続。	民間事業者 に貸付 売却手続			

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
62	旧朝日中学校	財産 運用課 障害 福祉課 学校 施設課	【現状】 体育館を新型コロナワクチン集団 接種会場として暫定活用中 校舎を社会福祉法人に貸付中（令 和6年度末までの予定） 【今後の予定等】 校舎貸付後、福祉ホームさくらん ぼ改修中の仮施設として活用予 定。 その後、区東部地域における学校 施設の改築を進めるための仮校舎 として活用する。	暫定活用	貸付		仮施設活用 (福祉ホーム さくらんぼ)
				貸付			
63	旧文成小学校	区民活動 推進課 財産 運用課 文化 デザイン課 企画課 (施設計 画担当)	【今後の予定等】 令和5年度から、区民活動推進課 統計調査事務室と郷土資料館の作 業場等として暫定活用する。 また、校舎の一部については、私立 学校法人に貸し付ける。 (令和5年3月～令和7年2月)	池袋第一小 学校仮校舎	暫定活用	貸付	暫定活用
				活用方針 検討			
64	旧真和中学校	西部生活 福祉課 文化 デザイン課 財産 運用課 学校 施設課	【現状】 暫定活用中 【今後の予定等】 施設を私立学校法人に貸し付け る。(令和5年10月頃～令和8年 度末まで) 施設の貸付状況や周辺学校施設の 老朽化状況などを踏まえ、仮校舎 としての活用を継続して検討す る。	仮施設活用 (西部生活 福祉課)	暫定活用	貸付	

(3) 未利用地

No.	旧施設名等	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和4年度	年度別計画		
					令和5年度	令和6年度	令和7年度
65	旧北大塚三丁目 児童遊園	福祉 総務課	【今後の予定等】 有効活用などを検討する。		活用検討		
66	旧西池袋二丁目 第二児童遊園	財産 運用課	【今後の予定等】 有効活用などを検討する。		活用検討		
67	要町一丁目 区有地	障害 福祉課	【今後の予定等】 有効活用などを検討する。		活用検討		
68	千川二丁目 区有地	福祉 総務課	【今後の予定等】 有効活用などを検討する。		活用検討		

2 延床面積の状況

指標名	令和4年 ＜現状＞	令和5年 ＜予定＞	令和6年 ＜予定＞	令和7年 ＜目標値＞	令和12年 ＜目標値＞
区が保有及び管理する 施設の延床面積	約 44.3 万㎡	約 45.1 万㎡	約 45.5 万㎡	約 45.1 万㎡	約 45.1 万㎡

※1 各年の基準日は、4月1日現在

※2 令和4年→令和5年の主な増減

面積増：池袋第一小学校、豊島区児童相談所・長崎健康相談所、区民ひろば要（西部生活福祉課複合施設）、区民ひろば椎名町複合施設、区民ひろば池袋複合施設の竣工など

面積減：旧第十中学校、千早地域文化創造館多目的ホール、旧保健福祉部分庁舎、旧朝日中学校別棟の解体など

※2 令和5年→令和6年の主な増減（見込み）

面積増：西部区民事務所等複合施設、高南小学校別棟、区民ひろば朝日の竣工など

面積減：旧竹岡健康学園の売却、南池袋小学校体育館棟、西部区民事務所、高南保育園の解体など

※3 目標値は「豊島区基本計画 2022-2025」による

3 インフラ施設の適正管理

(1) 道路の整備【道路整備課】

事業名	所管課	内容	各道路の進捗状況	
			事業名	進捗状況
無電柱化	道路整備課	「防災力の向上」「景観の向上」「安全・快適な歩行空間の創出」を目指し、既存の豊島区道の無電柱化を推進する。	巢鴨地藏通り	I工区 舗装工事 II工区 設計
			立教通り	I工区 工事
			東通り	検討
			平和通り	検討
			染井通り	検討
			補助176号線	設計、工事
道路整備	道路整備課	区道を良好な状態に維持するための道路整備に併せ、環境やバリアフリーに配慮した道路づくりを行い、歩行者空間を確保する。	補助80号線	測量
			補助171号線	設計
			補助172号線	設計
			補助173号線	工事
			坂下通り	設計
			大塚駅周辺	交差点改良、東側工事
			ハレザ池袋周辺	設計、工事
			寺町沿道	工事（令和5年度終了）

(2) 橋梁の長寿命化【道路整備課】

事業名	所管課	内容	各橋梁の工事進捗状況	
橋梁の長寿命化	道路整備課	橋梁の長寿命化対策を実施することで、ライフサイクルコストの低減と平準化を図る。	西巣鴨橋	令和7年度工事完了予定
			池袋大橋	令和12年度工事完了予定

(3) 自転車施設の長寿命化【土木管理課】


事業名	所管課	内容	対象施設数	令和4年度対策済数(進捗率)	年度別計画			
					内訳	令和5年度	令和6年度	令和7年度
自転車施設の長寿命化	土木管理課	自転車施設の照明、電磁ロック、管理人室等の改修を図る。	47施設	2施設(5%)	対策数	3施設	4施設	6施設
					累計(進捗率)	5施設(13%)	9施設(24%)	15施設(40%)

(4) 公園施設の長寿命化【公園緑地課】

事業名	所管課	内容	対象施設数	令和4年度対策済数(進捗率)	年度別計画			
					内訳	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公園施設の長寿命化	公園緑地課	公園施設(遊具)の長寿命化対策を実施し、修繕・補修等の経費節減を図る。	233施設	9施設(4%)	対策数	11施設	23施設	35施設
					累計(進捗率)	20施設(9%)	43施設(18%)	78施設(33%)

(5) 街路灯【公園緑地課】

事業名	所管課	内容	対象街路灯数	令和4年度対策済数(進捗率)	年度別計画			
					内訳	令和5年度	令和6年度	令和7年度
街路灯の省エネ化	公園緑地課	現在の水銀灯から、LEDなどの省エネ電灯への切り替えを進める。	8,669基	6,666基(79%)	対策数	600基	600基	600基
					累計(進捗率)	7,266基(84%)	7,866基(91%)	8,466基(98%)

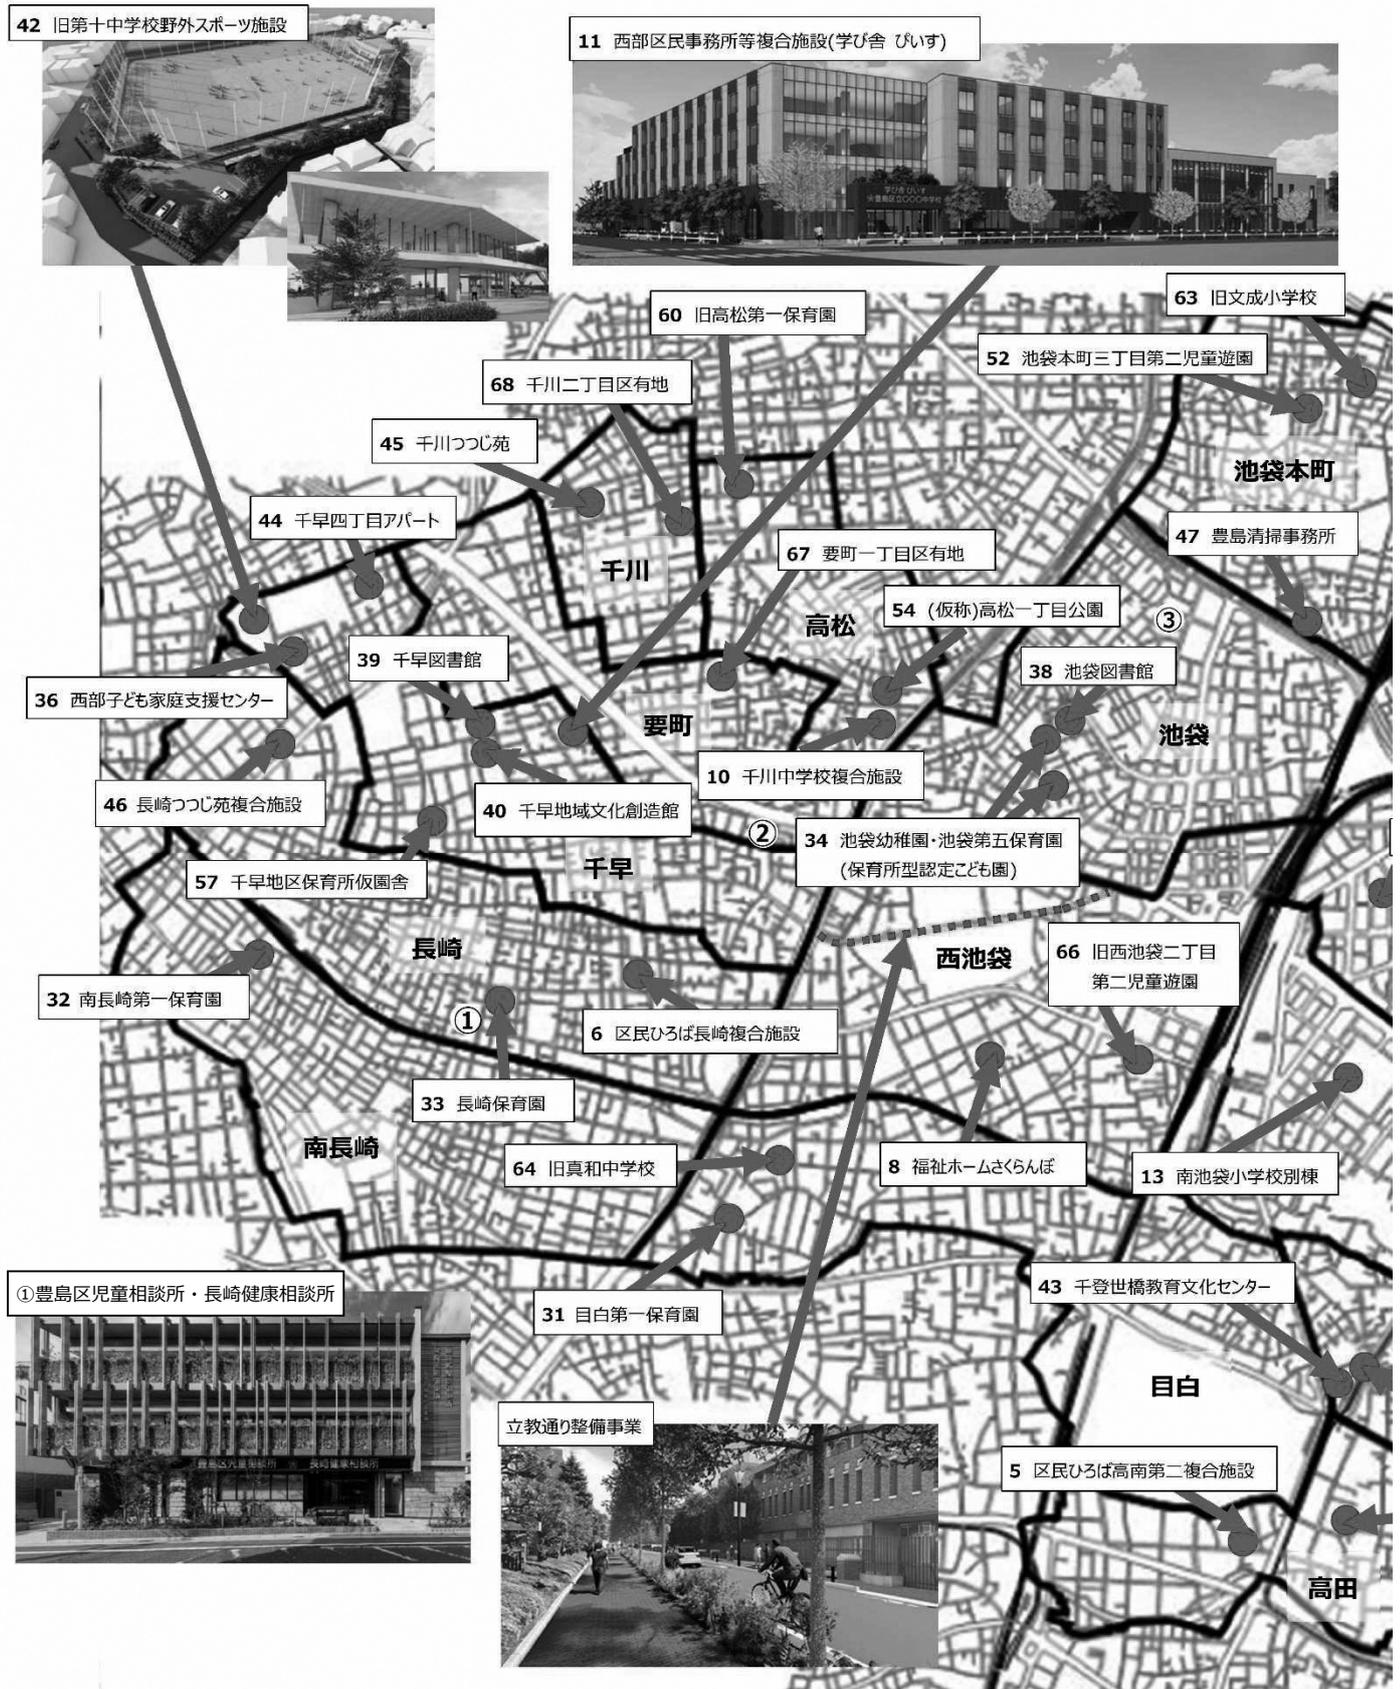



② 区民ひろば要 (西部生活福祉課複合施設)



③ 区民ひろば池袋



※学校施設については、新規整備・改築に関するもののみ地図上に示している。
 ※①～③は、令和5年2～4月間に開設予定の施設である。
