

令和7年度 第4回 教育に関する事務の点検・評価委員会

日時：令和8年1月20日（火）10時00分～

場所：富士見台小学校 1階 かがやきルーム

【次 第】

1 開 会

2 議 事

（1）評価対象事業のヒアリング及び質疑応答

① 学校施設環境改善交付金対象事業・富士見台小学校

3 閉 会

■ 資 料

資料1：事業分析シート【学校施設環境改善交付金対象事業・富士見台小学校】

令和7年度 教育に関する事務の点検 事業分析シート

事業名	学校施設環境改善交付金対象事業	担当課	学校施設課
教育ビジョン2019	基本方針6. 教師力の向上と魅力ある学校づくり	基本施策2 教育環境の整備	P.70
【参考】教育ビジョン2025	基本方針4. 教育環境の整備	4-③計画的な学校改築及び改修の実施	P.66

1. 事業概要

根拠法令	学校施設環境改善交付金交付要綱 新しい時代の学校施設整備補助事業補助金交付要綱 など	事業開始年度	毎年度交付申請をしている
事業の目的	交付金制度を活用しながら、学校施設における教育環境の充実、防災機能強化等の工事を行い、学習環境の質的向上を図る。		
事業の対象	区立学校施設(小学校22校、中学校8校、幼稚園3園)		
事業内容	学校施設の老朽化対応、及び教育環境の質的な向上を図るため、計画的に改築・改修を行う。 なお、年度ごとに改築・改修校が異なるため、事業費推移に計上した予算事業は、各年度以下の通り。 令和4年度:改築(池一小)、改修(小学校・中学校大規模、小学校・中学校・幼稚園一般、体育館トイレ) 令和5年度:改修(小学校・中学校大規模、小学校・中学校・幼稚園一般、学級増) 令和6年度:改築(千川中)、改修(小学校・中学校大規模、小学校・中学校・幼稚園一般、学級増) 令和7年度:改築(千川中)、改修(小学校・中学校大規模、小学校・中学校・幼稚園一般、学級増)		
外部委託の有無	なし		

2. 事業実績

令和6年度実績	国庫補助金及び都補助金を活用し、以下の改修工事等を実施した。 ※（ ）内は活用補助金								
	・仰高小学校【前払金のみ 工事は令和7年度】（大規模改造(空調)） ・西巣鴨小学校（大規模改造(空調)、都補助(バリアフリー設備)） ・池袋小学校【前払金のみ 工事は令和7年度】（大規模改造(空調)） ・目白小学校（屋外教育環境） ・長崎小学校(大規模改造(空調)) ・富士見台小学校（大規模改造(空調)） ・千早小学校【前払金のみ 工事は令和7年度】（大規模改造(空調)） ・さくら小学校（大規模改造(空調)）								
活動指標		指標	目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	7年度 (計画)
	①	改築工事の実施校数	→維持する	校	1	0	1	1	1
	②	補助金申請校数(国)	→維持する	校	14	10	11	13	11
	③	補助金申請校数(都)	→維持する	校	7	5	3	1	2
成果指標		指標	目指す方向性	単位	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	7年度 (計画)
	①	改築が完了した学校数(累計)	↗増加させる	校	10	10	10	10	10
	②	「協働のまちづくりに関する区民意識調査」で「学校施設の老朽化対策やバリアフリー化など安全安心な教育環境が提供されている」の設問に対する「どちらかというと思うわない」の回答比率	↘減少させる	%	—	—	—	9.7	9
	③								
成果	令和6年度については、約3000万円の補助金歳入があった。 補助金のメニューを確認し、最大限の活用を図っている。 マンホールトイレ整備の補助金については、防災危機管理課にて歳入している。(豊成小、長崎小)								

3. 事業費推移

単位 金額の項目:千円			5年度			6年度			7年度		
			予算	決算	執行率	予算	決算	執行率	予算	増減 (R6決算比)	
事業費			A	1,378,064	1,334,173	96.8%	3,436,119	1,478,321	43.0%	1,872,880	394,559
財源内訳	国、都支出金		B	107,519	72,884	67.8%	231,683	29,467	12.7%	141,175	111,708
	使用料・手数料			0	0		0	0		0	0
	地方債・その他			1,042,757	0		2,929,088	176,000		1,549,267	-1,379,821
	一般財源			C=A-B	227,788	1,261,289	553.7%	275,348	1,272,854	462.3%	104,047

4. 課題及び今後の方向性

課 題	補助対象となる改築・改修については最大限交付申請を行っているが、国・都の予算配分により採択されない事業があり、補助金収入が得られないことがある。 令和6年度については、令和5年度以前採択されていた照明改修工事について、交付決定が下りなかった。また、千川中学校については、入札不調の影響で、令和6年度内に改築工事に着手できなかった。
課題への対応方針	交付対象となる改築・改修事業について、東京都と協議をしながら、引き続き最大限交付申請を行っていく。全国市長会などの組織を通して、補助率や補助額の引き上げについて要望を続けていく。
次年度以降の方向性	補助メニューの対象となる事業については、もれなく補助金の交付申請を行っていくことで、区民意識調査の結果を改善していく。

事業費の推移について（学校施設環境改善交付金対象事業）

	令和 5 年度（千円）						令和 6 年度（千円）						令和 7 年度（千円）		
	予算			決算			予算			決算			予算		
	総額	補助金額	地方債等	総額	補助金額	地方債等	総額	補助金額	地方債等	総額	補助金額	地方債等	総額	補助金額	地方債等
小学校大規模 環境整備経費	540,380	30,795	509,585	525,601	17,825	0	540,380	80,481	459,899	343,318	22,169	0	869,532	98,152	771,380
中学校大規模 環境整備経費	95,850	9,894	85,956	77,635	9,823	0	95,850	0	95,850	26,776	0	0	168,196	30,200	137,996
小学校一般 環境整備経費	223,463	41,437	0	265,507	22,902	0	223,463	14,627	0	253,074	7,298	0	152,544	9,450	0
中学校一般 環境整備経費	55,051	11,258	0	53,741	3,009	0	55,051	0	0	46,772	0	0	62,866	0	28,072
幼稚園一般 環境整備経費	1,969	0	0	1,649	0	0	12,669	1,208	0	11,433	0	0	4,550	0	0
学級増に伴う 普通教室整備経費	461,351	14,135	447,216	410,040	19,325	0	461,351	0	461,351	375,704	0	0	369,175	3,373	365,802
千川中学校 改築事業経費							2,047,355	135,367	1,911,988	421,244	0	176,000	246,017	0	246,017
合計	1,378,064	107,519	1,042,757	1,334,173	72,884	0	3,436,119	231,683	2,929,088	1,478,321	29,467	176,000	1,872,880	141,175	1,549,267

※令和 6 年度の千川中学校改築事業経費は、新築工事契約の入札不調のため、1,573,071千円を令和 7 年度に繰越
千川中学校改築の補助金額133,933千円も同様に令和 7 年度に繰越

活動指標及び成果指標について（学校施設環境改善交付金対象事業）

1. 改築が完了した学校数

	学校	竣工年度
1	千登世橋中学校	平成13年度
2	南池袋小学校	平成15年度
3	明豊中学校	平成17年度
4	西池袋中学校	平成24年度
5	目白小学校	平成26年度
6	池袋本町小学校	平成28年度
7	池袋中学校	平成28年度
8	池袋第三小学校	平成28年度
9	巣鴨北中学校	令和元年度
10	池袋第一小学校	令和4年度
11	千川中学校	令和10年度予定

2. 補助金申請校数


年度	補助申請対象校
R4	巣鴨小（国、都）、西巣鴨小（国、都）、豊成小（国、都）、朋有小（国、都）、朝日小（国、都）、池袋第一小（国、都）、池袋第三小（国）、高南小（国）、椎名町小（国）、高松小（国）、駒込中（国）、池袋中（国）、千登世橋中（国）、明豊中（国、都）
R5	巣鴨小（国）、清和小（国）、池袋第三小（国）、池袋小（国、都）、南池袋小（国、都）、高南小（国、都）、長崎小（国）、要小（国）、椎名町小（国、都）、西巣鴨中（国）、西池袋中（国）
R6	仰高小（国）、駒込小（国）、西巣鴨小（国、都）、池袋小（国）、目白小（国）、長崎小（国）、富士見台小（国）、千早小（国）、高松小（国）、さくら小（国）、千川中（国）、西巣鴨幼（国）
R7	仰高小（国）、巣鴨小（国）、豊成小（国）、朝日小（国）、池袋小（国）、高南小（国）、長崎小（国）、富士見台小（国、都）、千早小（国）、明豊中（国、都）、千登世橋中（国）

3. 令和6年度の補助金内訳等

学校（工事内容）	国補助（千円）		都補助（千円）		合計（千円）	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
仰高小（空調改修）	0	2,920			0	2,920
駒込小（照明改修）	2,885	0			2,885	0
西巣鴨小（空調改修）	6,048	2,383			6,048	2,383
西巣鴨小（照明改修）	20,000	0			20,000	0
西巣鴨小（スロープ設置）			0	195	0	195
豊成小（マンホールトイレ）	2,598	0	1,299	0	3,897	0
池袋小（空調改修）	0	4,146			0	4,146
目白小（校庭修繕）	5,681	5,693			5,681	5,693
長崎小（マンホールトイレ）	3,366	0	1,683	0	5,049	0
長崎小（空調改修）	0	2,084			0	2,084
富士見台小（空調改修）	7,862	7,621			7,862	7,621
富士見台小（照明改修）	13,213	0			13,213	0
千早小（照明改修）	14,117	0			14,117	0
千早小（空調改修）	0	3,015			0	3,015
高松小（照明改修）	2,597	0			2,597	0
さくら小（照明改修）	13,759	0			13,759	0
さくら小（空調改修）	0	1,410			0	1,410
千川中（改築）	135,031	0	336	0	135,367	0
西巣鴨幼（照明改修）	1,208	0			1,208	0
合計	228,365	29,272	3,318	195	231,683	29,467


- ※1 マンホールトイレ補助金は防災危機管理課での歳入したため、学校施設課の歳入なし。
- ※2 照明改修については、全て交付決定されなかった。
- ※3 千川中学校については、入札不調の影響で、令和6年度予算を繰り越している。
都補助は繰越制度がないため、令和6年度申請なし。
- ※4 予算策定以降、追加補助申請が認められた事業あり（令和7年度工事の前払金など）

工事範囲(屋内)

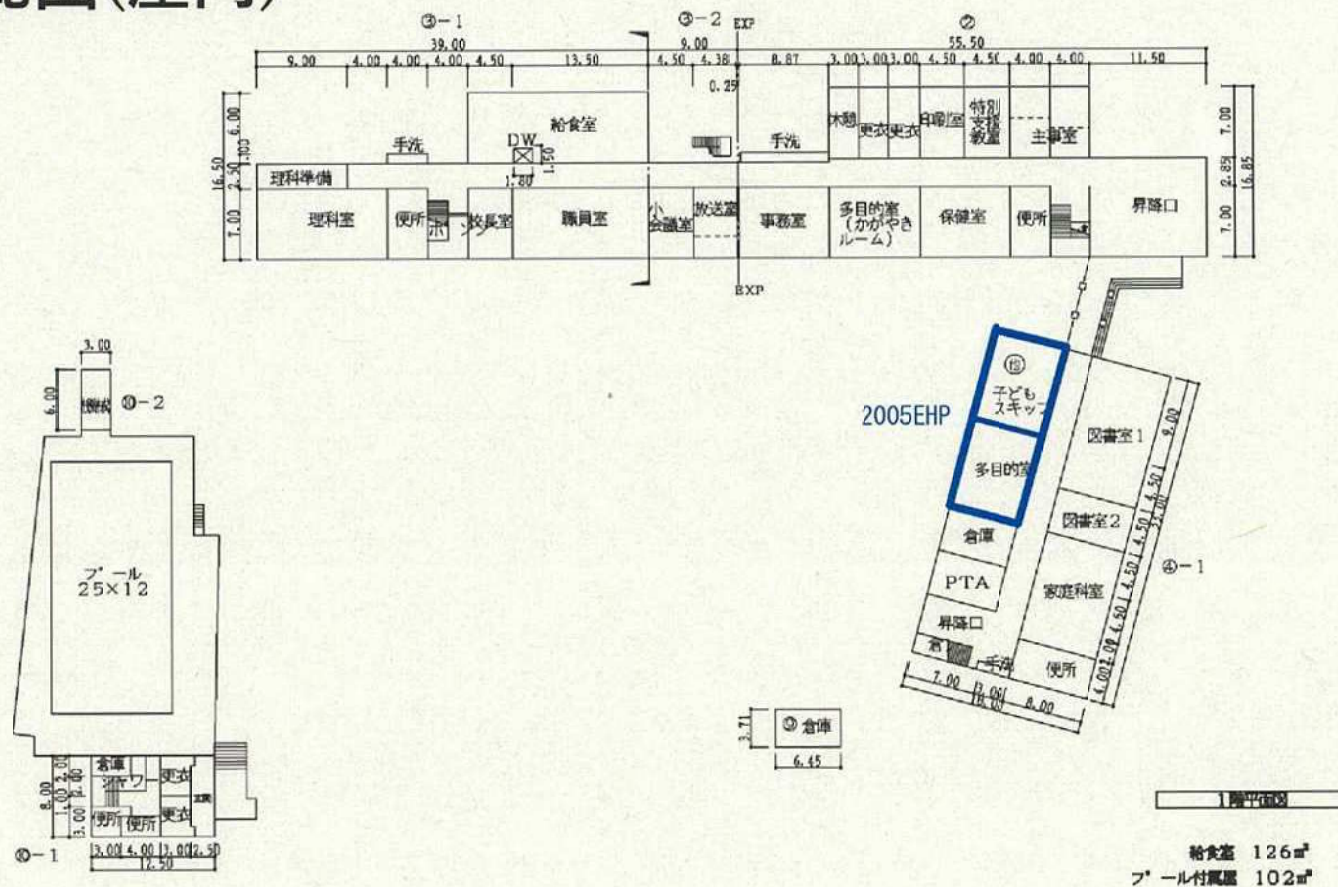


富士見台小学校普通教室冷暖房設備改修工事

工事範囲(屋内)

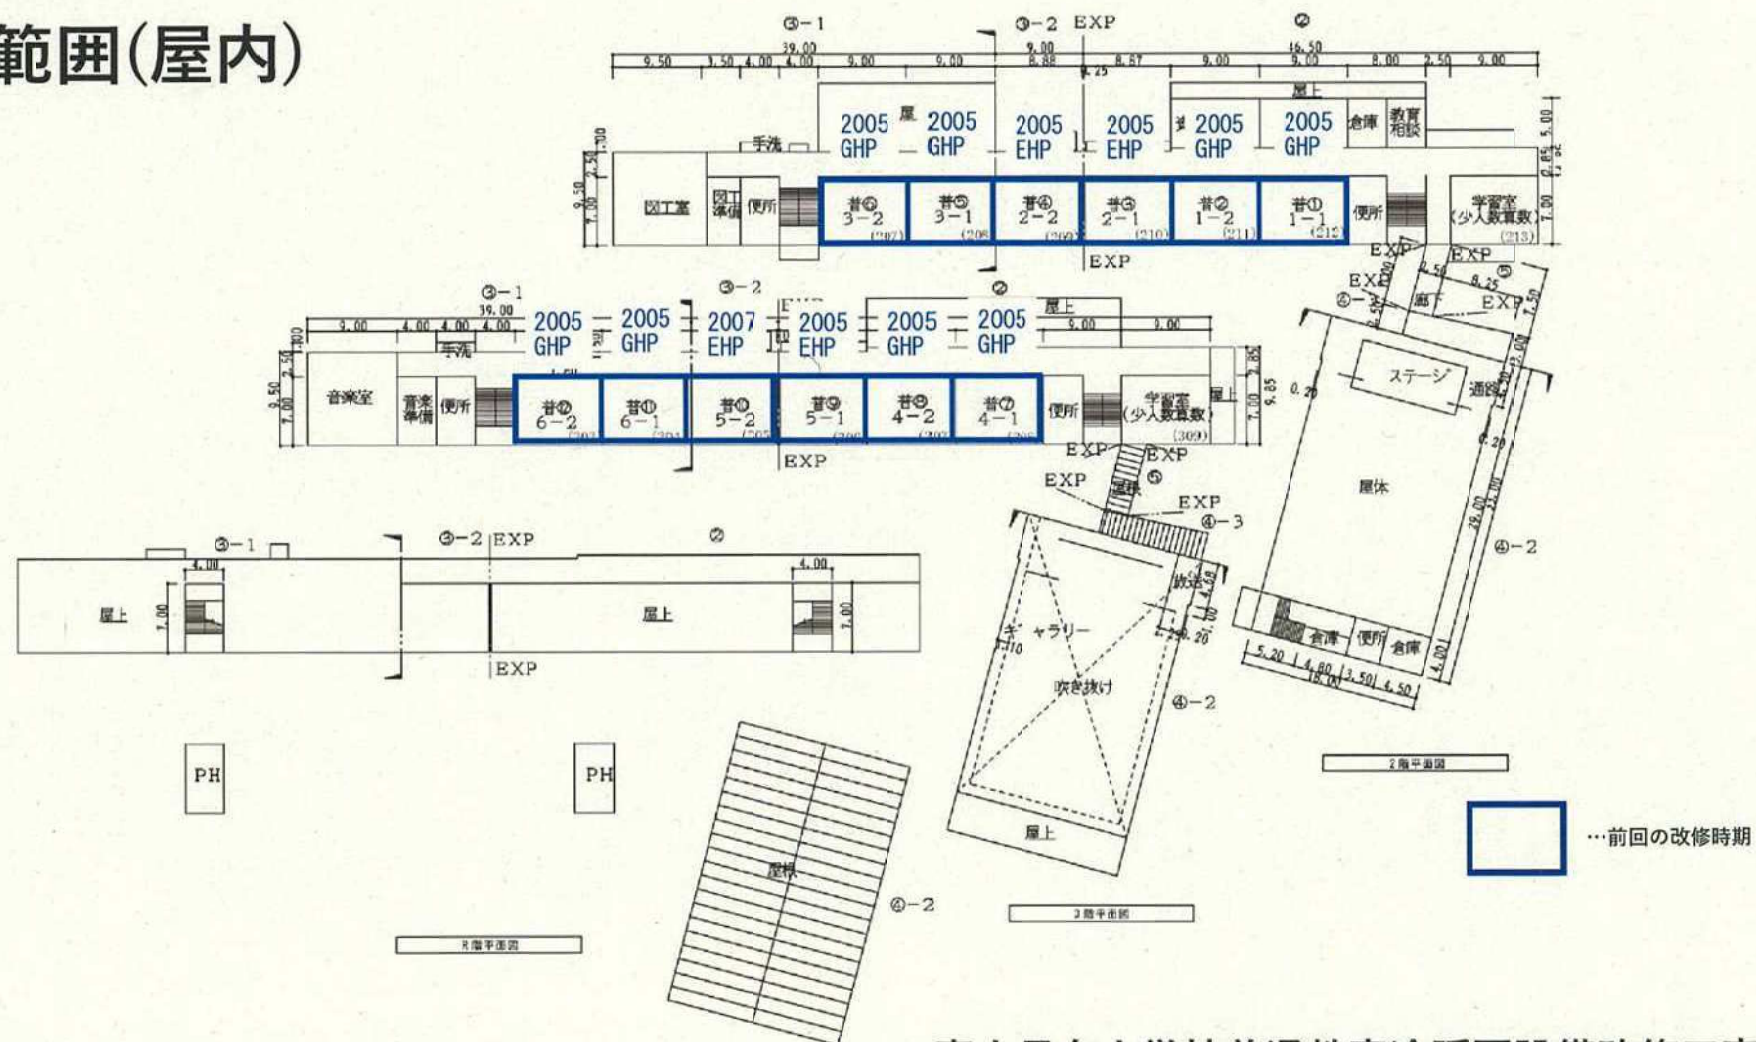

富士見台小学校普通教室冷暖房設備改修工事

工事範囲(屋外)

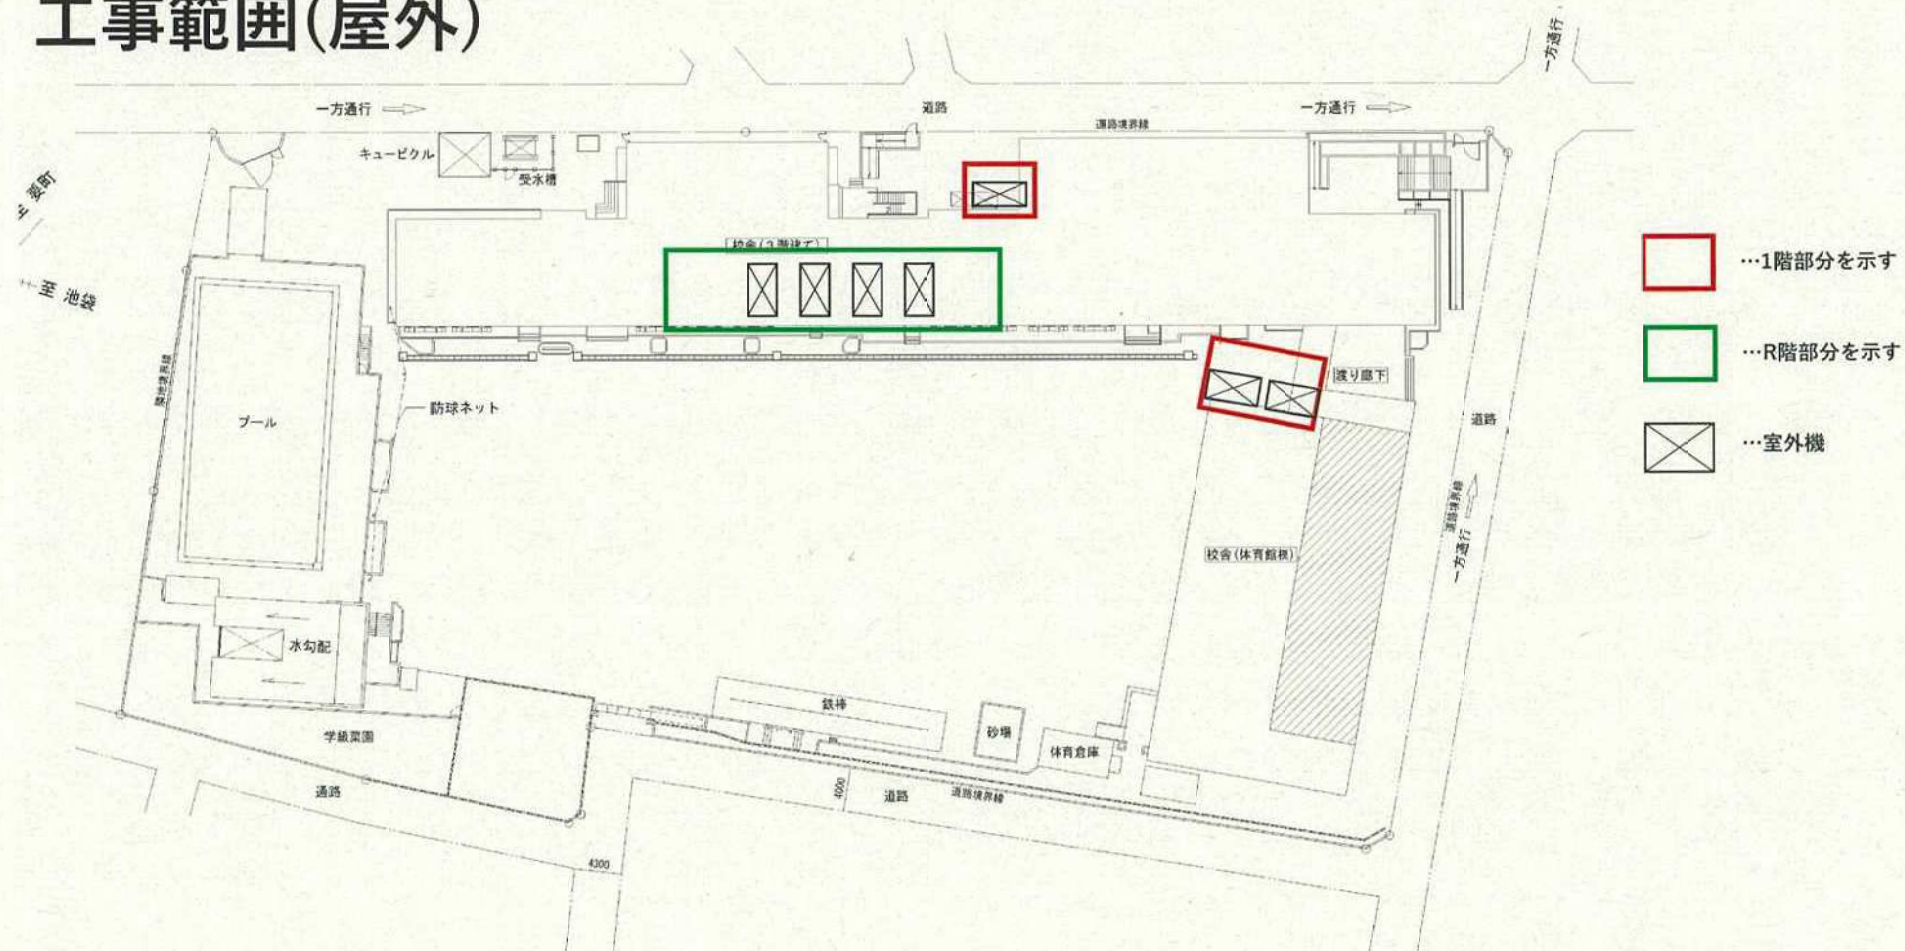

富士見台小学校普通教室冷暖房設備改修工事
